



**Obchodní akademie,
Střední odborná škola a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky,
Hradec Králové**



Revitalizace Ivanského jezera

Navrhni projekt 2025/2026

Autoři: Cao Ha My Thieu, Natálie Štěrbová

Pedagog: Ing. Jitka Rulfová Janů

Region: Královéhradecký kraj

OBSAH

1	POPIS VÝCHOZÍHO STAVU	2
1.1	PROČ JSME SI VYBRALY IVANSKÉ JEZERO?	3
1.2	HISTORIE.....	3
2	PRŮZKUM.....	4
2.1	PŘÁTELÉ IVANSKÉHO JEZERA	6
2.2	VYJÁDRĚNÍ STAROSTY MĚSTA ING. JANA SKOŘEPY	7
3	CÍLE PROJEKTU	8
3.1	PRVNÍ FÁZE – OBNOVA HRÁZE	8
3.2	DRUHÁ FÁZE – OPRAVA DŘEVĚNÝCH PRVKŮ.....	9
3.3	FÁZE 3 - NAUČNÁ STEZKA A OBČERSTVENÍ	14
4	ZDROJ FINANCOVÁNÍ	16
5	PŘÍJEMCE PODPORY	17
6	ČASOVÝ HARMONOGRAM	17
6.1	PRŮZKUM TRHU	19
6.2	VÝBĚR DODAVATELE	19
7	ROZPOČET PROJEKTU	20
7.1	CENOVÝ PRŮZKUM	20
7.2	POLOŽKOVÝ ROZPOČET	21
8	SWOT ANALÝZA.....	23
9	UDRŽITELNOST PROJEKTU	23
10	ZDROJE	25
11	SEZNAM OBRÁZKŮ.....	26

1 Popis výchozího stavu

Tento projekt se zabývá převážně tématy ochrany životního prostředí a veřejného prostoru v okrese Rychnov nad Kněžnou. Konkrétně se jedná o okolí Ivanského jezera, které se nachází přibližně 3 km jihovýchodně od okresního města, a představuje zónu odpočinku pro místní obyvatele (viz Obr. 1). Zároveň je jezero obklopeno přírodním parkem Les Včelný, který nabízí možnosti sportovních aktivit, jako např. běh, turistika, cyklistika atd. Cílem pro tento projekt je rekonstrukce hráze jezera a jeho okolí namísto plánované přeměny jezera na oblast mokřadů. Částečné vysušení jezera prezentuje Povodí Labe jako výhodnější alternativu k opravě hráze. Návrh projektu představený Povodím Labe se však nedočkal podpory ze strany obyvatel Rychnova nad Kněžnou a jeho okolí, natož pak spolku Přátel Ivanského jezera. Protiargumentem pro udržení vodní plochy je návaznost na dlouhodobou historii jezera, jeho protipovodňová funkce a vizuální stránka krajiny. Navození pocitů klidu a relaxu v okolí vodních ploch podporují i studie Völker & Kistemann (2011). Historička Hana Voškerušová-Balcarová navrhuje vytvořit projekt, který se snaží najít kompromis mezi zachováním hráze a současným vytvořením mokřadní plochy v okolí, čímž by se sladila historická hodnota s cíli ochrany přírody (viz Příloha 6) Problematickým zůstává v tomto projektu i vlastnictví, které je rozděleno mezi státní podnik Povodí Labe, jenž vlastní celou vodní plochu a má právo s ní hospodařit, a město Rychnov nad Kněžnou, které vlastní přilehlé pozemky (viz Příloha 8 a 9).

V dalších kapitolách tohoto projektu proto bude představen návrh, který by mohl být alternativou k projektu navrženému Povodím Labe, a částečně nalézá kompromis mezi názory všech zainteresovaných stran.



Obrázek 1 Současný stav Ivanského jezera

1.1 Proč jsme si vybraly Ivanské jezero?

Téma jsme si vybraly s cílem podpořit spolek „Přátelé Ivanského jezera“, který se dlouhodobě snaží zabránit zboření hráze a zachovat Ivanské jezero. Toto téma je nám osobně blízké, protože propojuje krajinu s lidmi, kteří ji využívají a mají k ní vztah. Projekt reaguje na aktuální hrozbu zásahu do krajiny a upozorňuje na význam jezera nejen z ekologického, ale i společenského hlediska. Zaměřuje se na zachování vizuální kontinuity krajiny, udržitelné formy rekreace a cestovního ruchu a zároveň podporuje udržení místní komunity a její vztah k tomuto místu.

1.2 Historie

První zmínky o Ivanském jezeře se objevily již v 17. století za bitvy na Bílé hoře. Samotná nádrž byla postavena mezi lety 1905 až 1907 na Javornickém potoce za účelem akumulace zásob vody v obdobích sucha. Jak uvedla Mgr. Hana Voškerušová-Balcarová: *„Primárním cílem projektu tedy nebyla ochrana před povodněmi, nýbrž stabilizace vodního zdroje a zajištění spolehlivého zásobování obyvatelstva i prosperujících podniků města vodou. Retenční charakter nádrže však přirozeně přinášel i vedlejší efekt částečné transformace průtoků a zpomalení odtoku při zvýšených srážkách.“* (viz Příloha 6)

Jezero, které je ve skutečnosti nádrží, v průběhu let přežilo několik povodní, z toho největší byla v roce 1907, kdy hladina vody přesahovala hranu hráze o 1,5 metru, další významná v roce 1997 vysoká 0,5m (viz Příloha 1). Dodnes jsou tyto události připomínány vyznačenými ryskami (Wikipedia, 2023). Mgr. Hana Voškerušová-Balcarová také připomíná, že nádrž má primárně funkci historickou a zároveň dokládá, *stavebně-technické řešení, ale i autenticky dochovanou funkci, kterou plní již více než sto let.*” (viz Příloha 6)

Ivanské jezero už v době vzniku Rakouska-Uherska bylo tichým a klidným místem v přírodě, kam lidé chodili na procházky, plavat a rekreačně rybařit. Nacházela se zde i první plovárna s výukou plavání. Na počátku 21. století byla oblíbenou atrakcí půjčovna loděk a možnost občerstvení v přilehlém altánku.

V okolí se také nachází údolí Kajetánka, ve kterém byla v roce 2002 postavena socha vodníka Kristiánka. Místo oplývá mnoha pověstmi spojenými s Čertovou jeskyní, Ivanovou skálou, která název po poustevníkovi Ivanovi, který je podle místí legendy o jeho patronem a ochráncem.



Obrázek 2 Socha vodníka Kristiánka

2 Průzkum

Jako první jsme v rámci našeho projektu jsme provedly průzkum veřejného mínění, abychom zjistily, zda občané okresu Rychnov nad Kněžnou o rekonstrukci okolí Ivanského jezera stojí. Zkonstruovaly jsme proto anonymní dotazník, který se skládal ze dvou otázek (viz Příloha 7):

1. Souhlasíte s tím, aby nedošlo k zániku Ivanského jezera?
2. Sem nám prosím napište jakékoli názory, nápady i kritiku. Např. pokud nesouhlasíte, tak důvod proč, pokud souhlasíte, napište nějaké tipy na věci, co vám chybí v okolí Ivanského jezera nebo v parku, různé zlepšováky atd.

První otázka měla možnost výběru odpovědi ano x ne, druhá byla otevřená. Celkem se nám podařilo sehnat 103 respondentů, kteří byli vybráni pomocí metody sněhové koule. Jak ukazují data, většina z nich hlasovala pro zachování jezera (viz Obr. 3), a někteří poskytli i slovní odpověď s názorem, jak se ohledně celé situace cítí. Tyto názory a připomínky jsme také reflektovaly v návrhu projektu. Reflexe názorů respondentů je důležitá, protože projekt tak vychází ze skutečných postojů veřejnosti, které pomáhají lépe reagovat na potřeby místní komunity a zvyšují jeho relevanci i přijatelnost v praxi.

ANO	NE
98	5



Obrázek 3 Výsledek hlasování

Zde je několik nápadů a reakcí:

„Ivanské jezero je moc krásné místo, chodím tam běžně na procházky a nedaleko je i hotel jehož návštěvníci se chodí podívat i k jezeru, chtělo by to ale nové chodníky a koše, aby návštěvníci jezera nemuseli zbytečně svoje odpadky shromažďovat a nechávat si je pak u sebe, lavičky na posezení, jelikož se lidi chodí dívat i na přehradu která je na místě.“ (respondent 1)

„Místo bourání by bylo lepší investovat do opravy hráze a zachovat jezero pro další generace.“ (respondent 2)

„Okolí Ivanského jezera je perfektním místem pro odpočinek, sport a napojení se na přírodu. Jezero i přilehlé lesy a cesty jsou poměrně dobře udržované a celoročně lákají desítky Rychnováků.“ (respondent 3)

„Vodní plochy pomáhají udržet vodu v krajině a poskytují přirozené prostředí pro mnoho živočichů a rostlin. Vodní zdroje nejsou nevyčerpatelné a jelikož je voda je základní zdroj života, měli bychom s ní dobře hospodařit.“ (respondent 4)

„Lepší chodníčky podle jezera, aby to využily i maminy s kočárky. Jo a odpadkové koše ♀ □ □ ♀ □.“ (respondent 5)

„Jsem pro zachování přírodního rázu krajiny a uvítala bych řádnou ochranu a údržbu dřevin.“ (respondent 6)

„Krásné místo pro únik z města a neodmyslitelná součást rodného města.“ (respondent 7)

2.1 *Přátelé Ivanského jezera*

Dalším krokem v celém projektu bylo spojení se se spolkem Přátelé Ivanského jezera, který vznikl v prosinci 2025 v reakci na rozhodnutí o zbourání hráze a ohrožení Ivanského jezera. Předmětem činnosti tohoto spolku je osvěta o přírodní lokalitě Ivanského jezera a okolí, podávání návrhů, připomínek orgánům veřejné správy odpovědným za existenci a podobu Ivanského jezera a okolí, a účast při řešení záležitostí týkajících se této lokality a účast při správních řízeních (viz Příloha 5).

Cílem spolku je zachování a rozvoj přírodní lokality, tj. Ivanského jezera a jeho okolí v lesoparku Včelný u Rychnova nad Kněžnou, rozvíjet povědomí obyvatel města a okolních obcí o historickém poslání lokality jako odpočinkové zóny a organizovat záchranu dané lokality v případě rozhodování o jejím zániku nebo změně.

Předsedou spolku se stal lékař a nezávislý zastupitel zvolený za ODS MUDr. Karel Jakoubek a místopředsedou pak Ing. Jiří Hájek. Předseda i místopředseda spolku jsou oprávněni jednat za spolek každý samostatně.

Spolek také spustil petiční akci „Záchrana Ivanského jezera“. Občané mohou svým podpisem podpořit snahu o zachování vodní plochy na několika místech v Rychnově nad Kněžnou. Petiční archy jsou k dispozici například v restauracích Panel, Panorama a „U Mařenky“, v informačním centru na Starém náměstí, v městské knihovně, ve vestibulu městského úřadu či v prodejně Maso-uzeniny Josef Dusbaba. Petice již čítá přes 4 500 podpisů.

K efektivnějšímu řešení situace spolek sezval všechny příznivce jezera na veřejné setkání, které se uskutečnilo ve čtvrtek 8. ledna 2026 od 17:00 hodin v hotelu Panorama. Tohoto jednání jsme se také zúčastnily za účelem získání informací a finálních návrhů řešení situace. Sešla se zde velká spousta občanů i vlivných lidí z Rychnovska. Na schůzi jsme se dozvěděly spoustu zajímavých informací ohledně aktuální situace, historie Ivanského jezera, i názory a postřehy občanů Rychnova nad Kněžnou a jeho okolí. Došlo tam i k mnoha dojemným momentům, kdy se starší občané veřejně podělili o to, co pro ně a jejich předky lokalita znamenala.

Dne 19. 2. 2026 se v Hotelu Studánka bude konat druhé setkání, které naváže na řešení budoucnosti vzpomínané oblasti. Jak uvádí Rychnovský deník, schůze se tentokrát zúčastní i vedení města Rychnov nad Kněžnou a vedení státního podniku Povodí Labe. I tuto schůzi chceme navštívit a nestranně tak získat další potřebné informace pro námi navrhovaný projekt.



Obrázek 4 Schůze spolku ze dne 8. ledna 2026

2.2 Vyjádření starosty města Ing. Jana Skořepy

Starostu města Rychnova nad Kněžnou jsme oslovily s cílem získat oficiální stanovisko samosprávy k celé situaci (viz Příloha 3). Tento krok byl veden snahou o zachování transparentnosti a zohlednění názorů všech zúčastněných stran. Vyjádření města poskytuje důležitý kontext pro pochopení širších dopadů projektu na místní komunitu i územní rozvoj. Zároveň přispívá k otevřenému dialogu mezi odbornou, veřejnou a politickou sférou. Pan Ing. Jan Skořepa nám sdělil, že stojí za tím, aby se původní hráz zachovala. Dle jeho slov je hlavním problémem finanční náročnost celého projektu - „Potíž je v tom, s ohledem na vlastnictví tohoto jezera i hráze, město Rychnov nad Kněžnou má poměrně omezené možnosti situaci ovlivnit. I

když jsem osobně nabízel i finanční spoluúčast města. Finanční náklad na provedení celé stavby je cca 100 milionů Kč. Na město je to poměrně velké „sousto“ protože roční investice města do veškerého majetku města se s ohledem na jeho velikost pohybují okolo této částky. Ideální stav by byl, kdyby Povodí Labe, státní podnik se pustilo do realizace stavby s tím, že město Rychnov nad Kněžnou přispěje část finančních prostředků právě s ohledem na tuto historickou památku a zachování přírodního kouzla příměstského lesa Včelný. „

3 Cíle projektu

Jak již bylo zmíněno, hlavním cílem tohoto projektu je revitalizovat Ivanské jezero a jeho okolí tak, aby se přirozeně propojila funkčnost a estetika tohoto rekreačního místa. Projekt klade důraz na udržitelnost z environmentálního i sociálního hlediska, přičemž environmentální rovina se zaměřuje na ochranu přírodních hodnot území a citlivé zásahy do krajiny. Sociální udržitelnost je v projektu chápána především jako podpora dlouhodobého využívání místa místními obyvateli, posilování jejich vztahu k jezeru a vytváření prostoru pro setkávání a rekreaci. Cílem je, aby jezero a jeho okolí prosperovalo nejen v současnosti, ale zůstalo udržovaným a atraktivním místem i pro budoucí generace.

Projekt by měl probíhat ve třech fázích. První fáze se zaměřuje na nejurgentnější problém – opravu a bezpečnost hráze. V druhé fázi by se dotace využily na opravu a nahrazení dřevěných konstrukcí a objektů v blízkosti jezera (lavičky, lávka, altán atd.). Poslední fáze projektu má za cíl podpořit zapojení místní komunity do projektu pomocí vybudování malého občerstvení, jehož výtěžek by z části putoval na pokrytí dalších finančních nákladů na udržování okolí v budoucnu. Zároveň navrhujeme otevření naučné stezky kolem jezera, která by nejen edukovala místní, ale zvýšila by turismus v oblasti, což by mělo pozitivní dopad i na služby v okolí Rychnova nad Kněžnou.

3.1 První fáze – obnova hráze

V první fázi obnovy se musí zajistit bezpečnost hráze, která je dle analýz Povodí Labe momentálně ve stavu, kdy by při výrazném zvýšení hladiny vody v jezeře mohlo dojít k jejímu fatálnímu poškození (viz Obr. 5). Tento argument ale dementuje spolek Přátel Ivanského jezera, který má dle jejich slov empirická data, která potvrzují poměrně stabilní stav hráze, která vyžaduje jen menší opravy (viz Obr. 6). Zároveň spolek plánuje investovat do dalších odborných analýz, jež budou podrobněji zkoumat stav hráze. Tyto výsledky spolek plánuje zveřejnit a použít při další schůzce s Povodím Labe.



Obrázek 5 Současný stav hráze



Obrázek 6 Vizualizace nové hráze

3.2 Druhá fáze – oprava dřevěných prvků

Druhá fáze revitalizace se soustředí na zlepšení funkčnosti a estetičnosti jezera a jeho bezprostředního okolí, jelikož některé prvky ohrožují bezpečnost a estetickou hodnotu místa. V návrzích míst na opravu jsme reflektovaly i návrhy respondentů uvedené v dotazníku.

Pozornost by byla věnována převážně dřevěným prvkům v okolí jezera, které vyžadují střední až významné opravy. Konstrukce lávky, která vede přes potok, vypadá velmi zanedbaně, neodpovídá bezpečnostním standardům a vlivem vlhkého prostředí podléhá rychlé degradaci (viz Obr. 7). Na obrázku 8 je návrh, podle kterého by se lávka mohla opravit. Lávka by zůstala dřevěná, aby se zachoval ráz krajiny.



Obrázek 7 Současný stav lávky



Obrázek 8 Návrh nové lávky

Jelikož je okolí Ivanského jezera i častou destinací pro sport a vycházky, rády bychom v rámci projektu opravily i altánek, který je využíván jako místo setkávání, prostor pro relaxaci, i jako přístřeší při nepříznivém počasí. Z obrázku 9 je patrné, že altánek není v dobrém stavu, proto ho navrhujeme nahradit novým altánem s dřevěnou konstrukcí (viz Obr. 10)



K altánku vede lesní cestička, která je sice přirozená a zapadá do okolní krajiny, ale v zimním období není příliš bezpečná (viz Obr. 11). Povrch je tvořen pouze hlínou, listím a kameny, a když napadne sníh nebo prší, cesta velmi klouže. Pohyb po svahu je pak obtížný a hrozí uklouznutí či pád. Bylo by proto vhodné vybudovat dřevěné schody, které by zlepšily bezpečnost pro návštěvníky (viz Obr. 12).



Obrázek 11 Současná cestička k rozhledně



Obrázek 12 Návrh schodů k rozhledně

V celém areálu se podél jezera nacházejí lavičky, které návštěvníků poskytují místa pro odpočinek s výhledem na jezero (viz Obr. 13). Celkem 15 laviček už je však značně opotřebovaných a zničených vlivy počasí. Projekt by tedy zahrnoval i nahrazení těchto laviček novými dřevěnými lavicemi pro zachování rázu okolí (viz Obr. 14).



Obrázek 14 Mapa laviček




Obrázek 13 Současný stav laviček

Dalším dřevěným prvkem vyžadující opravy jsou chodníky a zábradlí vedoucí podél strmých břehů jezera. Na obrázcích 15 a 17 je znatelné viditelné opotřebení, zároveň stárí materiálu začíná narušovat stabilitu zábradlí. Obrázek 16 a 18 jsou vizualizace zrekonstruovaných cest se zábradlími, které splňují bezpečnost a zároveň svým vizuálem nenarušují ráz krajiny. Dalším argumentem pro obnovu těchto a okolních cest je častá návštěvnost maminek s kočárky, proto které jsou rovné a dobře přístupné cesty nezbytností. Mimo jiné plánujeme do lokality umístit odpadkové koše, aby návštěvníci nemuseli nosit odpadky u sebe nebo je odhazovat do přírody, čímž udržíme okolí jezera čisté.



Obrázek 15 Současný stav a podoba cest v okolí Ivanského jezera

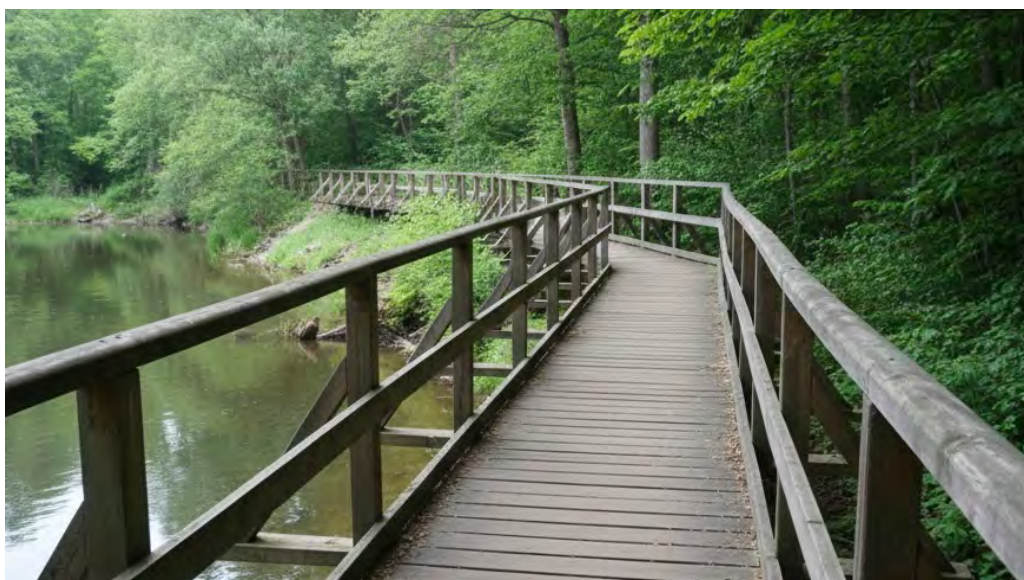

Obrázek 16 Návrh nových cestiček



Obrázek 17 - Současný stav cestiček



Obrázek 18 Návrh nových cestiček

3.3 Fáze 3 - naučná stezka a občerstvení

V poslední fázi projektu bychom rády u Ivanského jezera zavedly naučnou stezku, která návštěvníkům představí krásu a historii tohoto místa. Podél cestiček a jezera budou umístěny informační tabule věnované místním druhům stromů, rostlin a zvířat žijících v okolí jezera, jako jsou kachny, husy, ryby nebo žáby. Součástí stezky budou také informace o historii Ivanského jezera a jeho významu pro obyvatele Rychnova nad Kněžnou. Obohacení lokality o naučnou stezku, kterých je v regionu Podorlicka téměř 30, propojuje pohyb v přírodě a aktivní vzdělávání hrou.



Obrázek 19 - Návrh naučné tabule

Navrhujeme také přidání mola u jezera, které by mohlo sloužit nejen jako přístup k vodě, ale i jako atraktivní místo pro focení a odpočinek (viz Obr. 21). Součástí mola by byly dva čluny, které by návštěvníci mohli využít ke krátkým projíždkám po jezeře. Tento prvek by určitě zvýšil návštěvnost lokality, podpořil by rekreační využití jezera a vytvořil zajímavé místo pro focení. Zároveň by se v altánku u břehu jezera mohl obnovit prodej drobného občerstvení, což by podpořilo návštěvnost.



Obrázek 20 - Stav břehu Ivanského jezera



Obrázek 21- Návrh mola

4 Zdroj financování

Financování projektu bude primárně zajištěno prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který podporuje projekty zaměřené na rozvoj infrastruktury, ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj území. Projekt revitalizace Ivanského jezera svým charakterem naplňuje cíle IROP, zejména v oblasti zkvalitňování veřejného prostoru, podpory udržitelného cestovního ruchu a ochrany přírodního dědictví. Předpokládaný model financování počítá s tím, že přibližně 80 % celkových způsobilých výdajů by bylo hrazeno z dotačních prostředků IROP, což by umožnilo realizovat finančně nejnáročnější části projektu, především obnovu hráze, odbahnění a revitalizaci okolí jezera.

Zbývajících 20 % nákladů by bylo pokryto z rozpočtu města Rychnov nad Kněžnou formou spolufinancování. Zapojení města je klíčové nejen z finančního hlediska, ale i jako vyjádření podpory projektu ze strany místní samosprávy. Starosta města ve svém vyjádření uvedl, že město je připraveno projekt finančně podpořit, přestože si je vědomo jeho vysoké nákladnosti (viz Příloha 3). Tato skutečnost potvrzuje význam Ivanského jezera pro místní komunitu i jeho hodnotu z hlediska historického, krajinářského a rekreačního.

Kombinace dotačních prostředků z IROP a spolufinancování města vytváří stabilní a realistický finanční rámec projektu. Tento model zároveň rozkládá finanční odpovědnost mezi více

subjektů, posiluje princip partnerství mezi státní správou a místní samosprávou a přispívá k dlouhodobé udržitelnosti projektu i po jeho dokončení. Díky této spolupráci může být revitalizace Ivanského jezera realizována kvalitně, efektivně a s ohledem na budoucí generace.

5 Příjemce podpory


Název	Sídlo	IČO	Vztah k Ivanskému jezeru
Státní podnik Povodí Labe	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové, 500 03	70890005	majitel vodní plochy Ivanského jezera
Rychnov nad Kněžnou	Havlíčková 136, Rychnov nad Kněžnou, 516 01	00275336	majitel plochy okolo Ivanského jezera

6 Časový harmonogram

Časový harmonogram představuje jednotlivé kroky, ve kterých bude projekt postupně realizován. Projekt jsme rozdělily do čtyř hlavních fází – přípravné, administrativní, realizační a fáze revize a dlouhodobé udržitelnosti. Pro větší přehlednost jsme vytvořily tabulku a Ganttův diagram, který vizuálně znázorňuje časovou posloupnost jednotlivých aktivit. Každé fázi i konkrétním úkonům je přiřazen předpokládaný termín zahájení a úroveň rizika (risk level), která reflektuje možnou míru nejistoty či komplikací. Plán je částečně inspirován již předloženým dokumentem představující budoucí přestavbu Ivanského jezera (viz Příloha 2).

Za nejrizikovější (High Risk) jsme označily podání žádosti o dotaci, výběrové řízení a podpis smluv a dále oblast ochrany životního prostředí během realizace projektu i po jeho dokončení. Podání žádosti o dotaci je vysoce rizikové zejména z důvodu závislosti na externím rozhodování poskytovatele dotace, splnění formálních náležitostí a časové nejistoty schvalovacího procesu. Výběrové řízení a následný podpis smluv představují riziko především z hlediska legislativních požadavků, možnosti odvolání uchazečů či prodloužení administrativních lhůt. Ochrana životního prostředí je označena jako riziková proto, že projekt probíhá v citlivém území, kde je nutné dodržet přísné environmentální normy a předcházet negativním dopadům na ekosystém jezera i jeho okolí. Jakékoliv pochybení by mohlo vést ke zdržení projektu nebo k dodatečným nákladům.

Fáze projektu	Kategorie	Zodpovědná osoba	Progres	Začátek	Měsíce
Přípravná fáze					
Zakládací listina projektu	On Track	Natálie, Ha My	25%	18.01.2026	2
Průzkum trhu	On Track		30%	23.01.2026	2
Konzultace s Povodím Labe	On Track	Natálie	50%	23.01.2026	2
Konzultace se spolkem a městem	On Track		50%	23.01.2026	2
Administrativa					
Podání žádosti o dotaci	High Risk			19.03.2026	2
Schvalovací proces dotace	Med Risk			07.06.2026	4
Vyhlášení veřejných zakázek	Low Risk			15.10.2026	2
Výběrové řízení a podpis smluv	High Risk			14.12.2026	2
Finalizace	Goal			13.01.2027	
Realizace					
Design	Med Risk			12.02.2027	4
Oprava hráze a odbahnění	Goal			12.06.2027	14
Oprava dřevěných prvků	Goal			12.07.2027	4
Vybudování mola a instalace člunů	Goal			14.07.2027	3
Realizace naučné stezky	Goal			09.11.2027	3
Revize a udržitelnost					
Životní prostředí	Med Risk			12.02.2027	15
Kolaudace	Low Risk			07.02.2028	4
Pravidelná kontrola udržitelnosti	Milestone			20.03.2028	

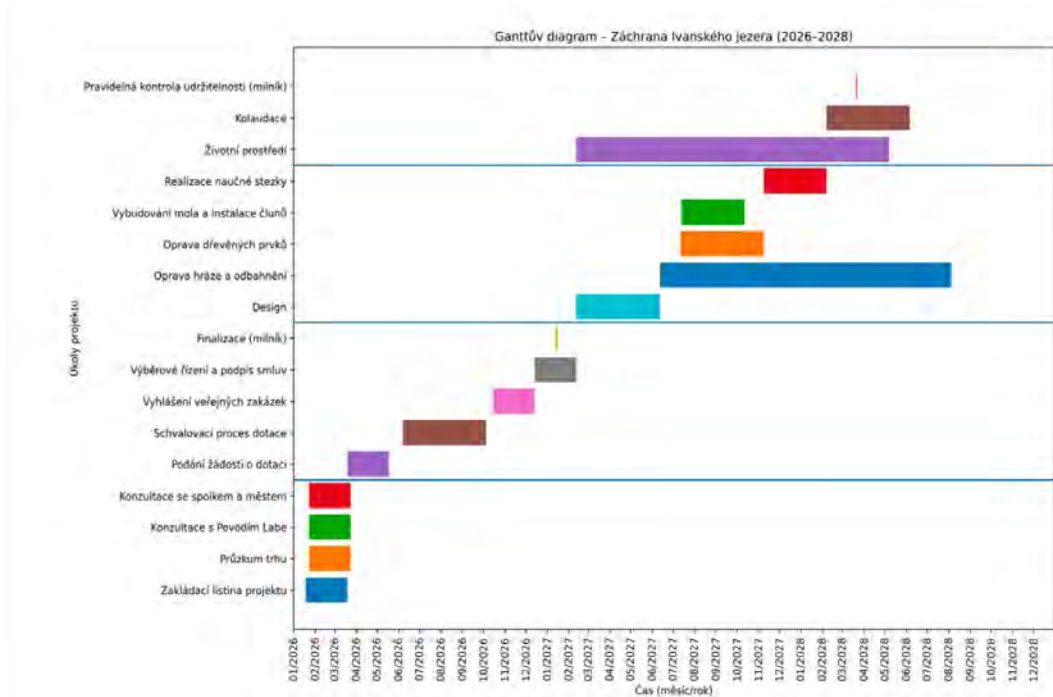

Z Ganttova diagramu je patrné, že časově nejnáročnější bude realizační fáze, zejména oprava hráze a instalace nových dřevěných prvků. Tato etapa je technicky i organizačně komplexní a vyžaduje koordinaci více subjektů. Významnou část harmonogramu zabírá také fáze administrativní, během níž je nutné zajistit veškerou dokumentaci, povolení a smluvní zajištění tak, aby revitalizace proběhla v souladu s platnou legislativou.

6.1 Průzkum trhu

Před zahájením realizace projektu byl proveden průzkum trhu, jehož cílem bylo zjistit dostupnost materiálů a ceny. Průzkum se zaměřoval především na terasová prkna ze sibiřského modřínu, konstrukční řezivo, spojovací materiál a další doplňky potřebné pro dřevěné konstrukce

Průzkum trhu byl proveden především přes internetové stránky dodavatelů, ceníků stavebnin a porovnáním nabídek několika firem v České republice. Mezi sledované dodavatele patřily například firmy Sibiřské dřevo s.r.o., Siberica Wood a Dřevodiskont s.r.o., které nabízejí přírodní dřevěné materiály vhodné pro venkovní použití.

Na základě průzkumu bylo zjištěno, že ceny terasových prken a řeziva se liší podle kvality materiálu, rozměrů a způsobu zpracování. Zároveň bylo ověřeno, že většina dodavatelů je schopna zajistit potřebné množství materiálu, které by bylo potřeba využít. U spojovacího materiálu, jako jsou nerezové vruty, je nabídka na trhu široká a materiál je běžně dostupný ve stavebninách a specializovaných prodejnách.

Výsledky průzkumu trhu ukázaly, že realizace projektu je z hlediska dostupnosti materiálů reálná a proveditelná. Díky porovnání jednotlivých nabídek je možné vybrat dodavatele, kteří nabídnou vyhovující kvalitu za přijatelnou cenu, a zároveň splní požadavky na použití přírodních a ekologických materiálů.

6.2 Výběr dodavatele

Při výběru dodavatelů materiálu pro výstavbu dřevěných konstrukcí bude kladen důraz především na kvalitu použitých materiálů a jejich šetrnost k životnímu prostředí. Cílem je spolupracovat s firmami, které využívají přírodní materiály, zejména dřevo, a zároveň dbají na principy udržitelnosti a odpovědného hospodaření se zdroji. Upřednostňování budou dodavatelé nabízející dřevo vhodné pro venkovní použití, například sibiřský modřín, který je přirozeně odolný vůči povětrnostním vlivům a má dlouhou životnost.

Mezi potenciální dodavatele lze zařadit například společnosti Sibiřské dřevo s.r.o., Siberica Wood nebo Dřevodiskont s.r.o., které se specializují na prodej terasových prken a stavebního materiálu z přírodního dřeva. Při finálním rozhodování však bude kromě kvality materiálu důležitá také jeho cena, dostupnost a spolehlivost dodání. Výhodou jsou firmy působící na území České republiky, jelikož kratší dopravní vzdálenosti přispívají ke snížení nákladů i ekologické zátěže.

Hlavním cílem je vybrat takové dodavatele, kteří nabídnou kvalitní a cenově přiměřené materiály, budou respektovat principy ochrany přírody a přispějí k realizaci stavby, která bude citlivě zapadat do krajiny Ivanského jezera a bude dlouhodobě sloužit místní komunitě i návštěvníkům.

7 Rozpočet projektu

7.1 Cenový průzkum

Položka	Množství	Průměrná cena za kus v Kč	Průměrná cena celkem Kč
Altánek	1 ks	62 200	62 000
Lavička v altánu	1 ks	6 000	6 000
Stůl v altánu	1 ks	4 000	4 000
Naučné tabule	5 ks	15 000	75 000
Lavičky	15 ks	9 459	141 885
Koše	10 ks	4 222	42 220
Dřevěná prkna	700 ks	315	220 500
Šrouby a terasové vruty	400 ks	2,50	1 000
Nosné trámy (hranol)	100 m	750	75 000

Betonové patky/kotvy	50 ks	100	5 000
Člunová loďka	2 ks	25 000	50 000
Celkem	682 805		

7.2 Položkový rozpočet

Hmotné položky

Položka	Množství	Průměrná cena celkem (v Kč)	Popis produktu
Altánek	1 ks	62 200	Venkovní šestiboký altánek-smrk
Lavička v altánu	1 ks	6000	Lavice po obvodu stolu-smrk
Stůl v altánu	1 ks	4 000	Materiál-smrk
Naučné tabule	5 ks	75 000	Dřevěné tabule vyrobené z modřínu s malou střechou
Lavičky	15 ks	141 885	Lavičky s opěradly – smrkové latě
Odpadkové koše	10 ks	42 220	Kovový koše s dřevěným obložením
Dřevěná prkna	700 ks	220 500	Materiál-sibiřský modřín
Šrouby a terasové vruty	400 ks	1 000	Spojení dřevěných konstrukcí, zajištění pevnosti
Nosné trámy (hranol)	100 m	75 000	Nosné konstrukce staveb, zajištění stability
Betonové patky/kotvy	50 ks	5 000	Ukotvení konstrukcí, zvýšení bezpečnosti
Člunová loďka	2 ks	50 000	Vyráběný rotačním tvářením, projížďky na jezeře
Celkem	682 805		

Služby

Položka	Cena (v Kč)	Popis služby
Demolice stávající hráze	5 000 000	Kompletní rozebírání staré hráze, odvoz sterého materiálu
Stavba nové hráze	45 000 000	Výstavba tělesa dle vizualizace, nové výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv a mostní konstrukce
Jiné stavební práce	8 000 000	Demolice starých konstrukcí, odvoz starého materiálů, stavba altánku, laviček...
Grafika naučných tabulí	15 000-35 000	Grafické návrhy pro výplň naučných tabulek
Tisk náplně naučných tabulí	8 000-18 000	Tisk jednotlivých náplní naučných tabulek
Odbahnění	25 000 000	Odbahnění jezera (cca 20 000 m ³) , zpevnění břehů a úprava dna jezera
Odvoz bahna	15 000 000	Doprava tisíce tun materiálů a vysoké poplatky za uložení na specializovanou skládku
Grafiky, vizualizace	2 000 000	Projektová dokumentace, inženýři
Celkem	100 023 000–100 053 000	

8 SWOT analýza

Abychom plně porozuměly všem příležitostem, ale i rizikům, vytvořily jsme SWOT analýzu, kterou jsme pečlivě zpracovaly.



Silné stránky

- Revitalizace dlouhodobě neudržované a zanedbané oblasti
- Tento projekt by pomohl ke spokojenosti občanů
- Znovuobnovení rychnovské historické památky a oblíbeného vycházkového místa
- Kultivace veřejného prostoru obce
- Park nabídne možnost edukace o ekologii a biosféře, která se nachází okolo
- Podpora zdravého životního stylu
- Záchrana přirozené biodiverzity živočichů i rostlin
- Udržení stávajícího ekosystému



Slabé stránky

- Technicky náročná rekonstrukce
- Nutná spolupráce více subjektů
- Organizačně i časově náročná rekonstrukce



Příležitosti

- Možnost snížení nákladů do dalších let, jelikož oblast každým rokem víc a víc zaostává
- Rozvoj sportu okolo Ivanského jezera
- Možnost dlouhodobého rozvoje projektu (přidávání nových cestiček, naučných tabulí, ...)



Rizika

- Riziko vandalismu
- Odcizení lodičky
- Nedostatek finančních prostředků
- Komplikace při realizaci projektu

9 Udržitelnost projektu

Udržitelnost projektu revitalizace ploch u Ivanského jezera u Rychnova nad Kněžnou je proces, jehož cílem je zachovat funkčnost, přínosy a kvalitu realizovaných opatření i po ukončení financování z Integrovaného regionálního operačního programu. Projekt je realizován

ve spolupráci s městem Rychnov nad Kněžnou, které se bude podílet na zajištění provozu, údržby a dalšího rozvoje revitalizovaného území.

Po dokončení projektu bude zajištěna pravidelná údržba všech nově vzniklých a obnovených objektů, zejména opravené hráze jezera, vybudovaného mola, lávek, altánku, pěších cestiček a přístupových cest. Je potřeba zajistit také pravidelné technické kontroly jejich stavu, drobné opravy a pravidelné péče o okolní travnaté plochy a zeleň. Údržba bude probíhat v souladu s platnými bezpečnostními, stavebními a environmentálními předpisy, aby byla zachována dlouhodobá funkčnost a bezpečnost pro návštěvníky.

Součástí projektu je také odstranění sedimentů a vývoz bahna, což přispěje ke zlepšení vodního režimu a ekologické stability jezera. Tento zásah má dlouhodobý charakter a pozitivní vliv na kvalitu vody, biodiverzitu a celkový stav vodní plochy. Pravidelný monitoring stavu jezera a jeho okolí umožní včasnou reakci na případné negativní vlivy a zajistí zachování dosažených přínosů i v následujících letech.

Revitalizované území bude nadále sloužit jako veřejně přístupný rekreační a odpočinkový prostor, podporující aktivní i pasivní trávení volného času obyvatel města Rychnov nad Kněžnou i návštěvníků regionu. Opravené cestičky, lávky a mobiliář přispějí ke zvýšení komfortu uživatelů a zároveň zajistí bezbariérovější přístup do vybraných částí území. Projekt tak přispívá k dlouhodobému zlepšení kvality veřejného prostoru a posiluje jeho společenskou a rekreační funkci.

Dlouhodobá udržitelnost projektu je rovněž podpořena zapojením místní samosprávy, která má zkušenosti s péčí o veřejná prostranství a má k dispozici potřebné technické i personální zázemí. Financování provozu a údržby revitalizovaného území bude zajištěno z běžných rozpočtových prostředků města Rychnov nad Kněžnou, případně z dalších dostupných zdrojů, aniž by bylo nutné další financování z fondů Evropské unie.

Projekt je navržen s důrazem na environmentální, ekonomickou i sociální udržitelnost. Použité materiály a stavební řešení jsou voleny s ohledem na jejich dlouhou životnost, nízké nároky na údržbu a šetrnost k životnímu prostředí. Revitalizace ploch u Ivanského jezera tak představuje dlouhodobě udržitelné řešení, které přispěje ke zvýšení atraktivity území, ochraně přírodních hodnot a zlepšení životních podmínek obyvatel města Rychnov nad Kněžnou i širšího okolí.

10 Zdroje

- Schůzka Přátel Ivanského jezera – pamětníci, předseda a místopředseda
- Vyjádření starosty města Rychnov nad Kněžnou Ing. Jana Skořepy
 - Völker, S., & Kistemann, T. (2011). The impact of blue space on human health and well-being-Salutogenetic health effects of inland surface waters: A review. International journal of hygiene and environmental health, 214(6), 449-460.
 - Wikipedia. (2023). Ivanské jezero.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ivansk%C3%A9_jezero
 - <https://www.hkregion.cz/dr-cs/s-naucne-stezky/#page=3;orderby=24%7CDESC;skat=;gregionvybrane=2583>

11 Seznam obrázků

<i>Obrázek 1 Současný stav Ivanského jezera.....</i>	<i>2</i>
Obrázek 2 Socha vodníka Kristiánka.....	4
Obrázek 3 Výsledek hlasování.....	5
Obrázek 4 Schůze spolku ze dne 8. ledna 2026.....	7
Obrázek 5 Současný stav hráze.....	9
Obrázek 6 Vizualizace nové hráze.....	9
Obrázek 7 Současný stav lávky.....	10
Obrázek 8 Návrh nové lávky.....	10
Obrázek 9 Současný stav rozhledny	10
Obrázek 10 Návrh nové rozhledny	10
Obrázek 11 Současná cestička k rozhledně	11
Obrázek 12 Návrh schodů k rozhledně	11
Obrázek 13 Současný stav laviček.....	12
Obrázek 14 Mapa laviček.....	12
Obrázek 15 Současný stav a podoba cest v okolí Ivanského jezera	13
Obrázek 16 Návrh nových cestiček.....	13
Obrázek 17 - Současný stav cestiček	14
Obrázek 18 Současný stav cestiček.....	14
Obrázek 19 - Návrh naučné tabule.....	15
Obrázek 20 - Stav břehu Ivanského jezera.....	15
Obrázek 21- Návrh mola.....	16

Příloha 1:

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8

Slezské Předměstí

500 03 Hradec Králové



Tisková zpráva

Obnova vodního díla Ivanské jezero

Hradec Králové, 5. 5. 2021 – Povodí Labe připravuje celkovou obnovu Ivanského jezera na Javornickém potoce. Jedná se o vodní dílo vybudované na začátku 20. století za účelem protipovodňové ochrany Rychnova nad Kněžnou.

Vodní dílo bylo zbudováno v letech 1905 – 1907 firmou Lorenc a Dědek ze Solnice dle projektu Ing. Ortla. Hlavním účelem výstavby vodního díla byla částečná retence povodňové vlny, která umožnila plynulejší průchod velkých vod v řece Kněžné protékající městem Rychnov nad Kněžnou. Po úpravě řeky Kněžny v intravilánu města v roce 1937 ztratila ochranná funkce nádrže Ivanského jezera na významu.

Více než 110 let staré vodní dílo za dobu své existence při velkých povodních několikrát neřízeně přeteklo přes korunu hráze. Přes pravidelnou péči, kterou Povodí Labe hrázi věnuje, postupem času došlo k závažné degradaci výplňového zdiva. Vodní dílo vykazuje dlouhodobě řadu provozních poruch, což potvrdil i *Návrh opatření k zajištění bezpečnosti a stability vodního díla*, který si nechalo zpracovat Povodí Labe od společnosti VODNÍ DÍLA – TBD a.s. v listopadu 2016.

Návrh se zabýval možnostmi rekonstrukce formou výstavby nové hráze, přezdění a zatěsnění návodního líce hráze nebo zajištěním narušeného tělesa hráze injektáží. Vzhledem k příčinám poruch bylo jako nejvhodnější řešení zvoleno nahrazení stávající hráze hrází novou, která bude splňovat současné nároky na bezpečný provoz vodních děl.


Při návrhu vzhledu nové hráze byl brán v potaz důraz na začlenění stavby do krajiny a zajištění dlouhé životnosti navržených konstrukcí, při snaze v maximální možné míře zachovat vzhled původní kamenné hráze.

Výrazným současným estetickým prvkem je převod vody přes bezpečnostní přeliv. Nově navržený režim převodu vody přes dílo tento prvek v letních měsících zachová a zvyšuje atraktivitu místa návrhem vyhlídkového místa v rozšířené části koruny hráze.

Součástí obnovy vodního díla bude odtěžení sedimentu v objemu cca 20 tis. m³, což bude mít pozitivní vliv na kvalitu vody v nádrži.

Celá akce je podmíněna zajištěním přístupu pro těžkou techniku. Proto bude realizaci předcházet zbourání mostu s nedodatečnou nosností a výstavba nového mostu přes Javornický potok pod Ivanským jezerem.

V roce 2020 Povodí Labe zadalo zpracování projektové dokumentace řešící celkovou obnovu vodního díla. Zahájení prací na místě předpokládáme nejdříve koncem roku 2023 a realizace potrvá 3 roky. Náklady na rekonstrukci hráze a mostu jsou v současnosti vyčísleny na 55,5 mil. Kč bez DPH.

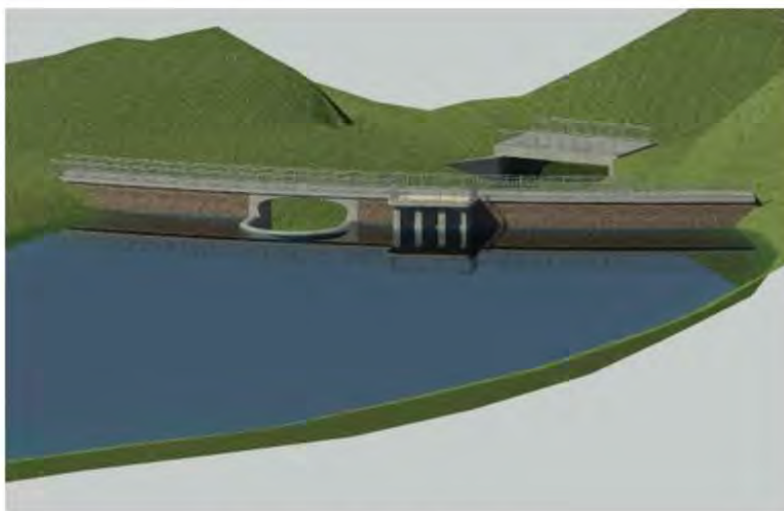

Vizualizace návodního líce nové hráze

Hana Bendová, tisková mluvčí, tel. 495 088 605, e-mail bendovah@pla.cz

Příloha 2:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - RELAI

g) *dot3 - dopravní stavby (sčuzem')*

dopravních v rámci akce „VD Ivanské jezero, rekonstrukce hráze, ř.km 3,400 – dopravní stavby“.

ODTĚŽENÍ NÁNOSŮ

d)

prodloužení platnosti stávajícího povolení stavby vodního díla „VD Ivanské jezero, Rychnov n. Kn., odtěžení nánosů, ř.km. 3,400 – 3,700“ a o stanovení nového termínu k dokončení této stavby. Povolení změny stavby toho vodního díla bylo vydáno rozhodnutím MěÚ Rychnov n. Kn., OVŽP pod č.j. MURK-OVŽP-37755/2022-7700/2022-Ku ze dne 11.ledna 2023, rozhodnutí nabylo právní moci dne 31.01.2023.

- stavba odbahnění nádrže („VD Ivanské jezero, Rychnov n. Kn., odtěžení nánosů, ř.km 3,400 – 3,700“), která řeší odstranění sedimentů z prostoru zátopy VD Ivanské jezero, je povolena samostatným rozhodnutím a zahrnuje stavební objekty – SO 01 Sedimentační hrázky a SO 02 Odtěžení sedimentů.

1. Lhůta k dokončení celé stavby se stanoví **do 31.12.2032.** *Do prodloužení - 19.12.2025*
2. Platnost povolení záměru se prodlužuje v souladu s § 198 stavebního zákona **do 31.01.2030.**

Demolice

3)

Na ni bude navazovat provedení stavební akce – „VD Ivanské jezero, Rychnov n. Kn., rekonstrukce hráze, ř.km. 3,400 – Vodohospodářská část, SO 02 Demolice“, kterou bude zajištěno odstranění stávající hráze a povolena také samostatným rozhodnutím.

přehled

- povolení k odstranění stavby vodního díla – „VD Ivanské jezero, Rychnov n. Kn., rekonstrukce hráze, ř.km. 3,400 – Vodohospodářská část, SO 02 Demolice“, bylo vydáno rozhodnutím MěÚ Rychnov n. Kn., OVŽP pod č.j. MURK-OVŽP-35660/2022-7606/2022-Ku ze dne 23.ledna 2023, rozhodnutí nabylo právní moci dne 09.02.2023. *zmeřeno 3.5.2025 se stanovuje lhůta*

- Odstranění stavby bude dokončeno ve lhůtě **do 31.12.2032.** ←

STAVBA HRÁZE

h)

Jedná se o stavbu, která je navázána na další související stavební povolení, celkově časově náročně a většího rozsahu. Vlastnímu provádění této stavby vodního díla – „VD Ivanské jezero, rekonstrukce hráze, ř.km. 3,400- Vodohospodářská část“ bude předcházet realizace staveb

stavby vodního díla – „VD Ivanské jezero, rekonstrukce hráze, ř.km. 3,400- Vodohospodářská část“ a bylo vydáno rozhodnutím MěÚ Rychnov n. Kn., OVŽP pod č.j. MURK-OVŽP-37456/2022-8011/2022-Ku ze dne 28.února 2023, rozhodnutí nabylo právní moci dne 29.03.2023.

2- 16. 4. 2025 prodloužení lhůty

3. Lhůta k dokončení celé stavby se stanoví **do 31.12.2032.** ↗
4. Platnost povolení záměru se prodlužuje v souladu s § 198 stavebního zákona **do 31.01.2030.**

Příloha 3:

Email od starosty města Rychnova nad Kněžnou Ing. Jana Skořepy

[341] Doručené – Seznam Email

12.02.2026 18:14

 **Skořepa Jan** Jan.Skorepa@rychnov-city.cz

natalasterbova@seznam.cz

28. 1. 2026, 11:31

 **RE: Projekt "Záchrana Ivanského jezera"** 

 Shrnout konverzaci

 Shrnout e-mail

Dobrý den,
Pokud Vám to pomůže ve Vašem projektu, můžete mne klidně citovat.
Děkuji a přeji příjemný den.
Jan Skořepa

From: natalasterbova@seznam.cz <natalasterbova@seznam.cz>
Sent: Wednesday, January 28, 2026 11:19 AM
To: Skořepa Jan <Jan.Skorepa@rychnov-city.cz>
Subject: RE: Projekt "Záchrana Ivanského jezera"

Dobrý den,
moc Vám děkuji za Vaše vyjádření, opravdu mi to v mém projektu pomůže. Ještě jsem se chtěla zeptat, jestli je v pořádku a souhlasíte s tím, že Váš názor ocituji a použiji v mé práci.

Děkuji
S pozdravem
Natálie Štěrbová
----- Původní e-mail -----
Od: Skořepa Jan <Jan.Skorepa@rychnov-city.cz>
Komu: natalasterbova@seznam.cz <natalasterbova@seznam.cz>
Datum: 27. 1. 2026 9:52:57
Předmět: RE: Projekt "Záchrana Ivanského jezera"

Dobrý den,
Vlastníkem Ivanského jezera i hráze je státní podnik Povodí Labe, Stávající hráz byla vybudována v letech 1905 – 1907. Je tedy cca 120 let stará. Na hrázi se začaly projevoval známky stáří a je zřejmé, že stávající hráz nemůže dlouhodobě tak jak je existovat. Proto Povodí Labe, státní podnik zadalo někdy v roce 2020 zadalo zpracování projektové dokumentace, na základě které pak získalo stavební povolení na:

- 1 – odbahnění jezera (cca 20.000 m3),
- 2 – demolici stávající hráze,
- 3 – stavbu hráze nové.

Stavební povolení jsou v současné době prodloužena do roku 2030.

Dále Město Rychnov nad Kněžnou uzavřelo se státním podnikem Povodí Labe dvě smlouvy, které se týkají:

<https://email.seznam.cz/?u=87758736&l&q=label-id%3A258&mid=7085>

Stránka 1 ze 3

- 1 – práva stavby na v současnosti městských pozemcích (všechny pozemky okolo vodního díla jsou v majetku města RK),
- 2 – uspořádání po ukončení stavby – převzetí vyvolaných investic stavbou.

Tyto smlouvy mají časové omezení do konce roku 2028, do kdy by stavba měla být zahájena.

Problém nastal v tom, že státní podnik Povodí Labe nezískal a nezíská dotaci na tuto stavbu z důvodu protipovodňové ochrany, neboť po uskutečnění regulace řeky Kněžná, která protéká Rychnovem nad Kněžnou, hráz ztratila z hlediska protipovodňové ochrany svoji funkci.

Státní podnik Povodí Labe deklaroval, že pokud na stavbu hráze nezíská dotaci, pak stavbu nebude realizovat.

Můj názor je ten, že by bylo velice dobré a užitečné zachovat původní ráz příměstského lesa Včelný včetně Ivanského jezera. Potíž je v tom, s ohledem na vlastnictví tohoto jezera i hráze, město Rychnov nad Kněžnou má poměrně omezené možnosti situaci ovlivnit. I když jsem osobně nabízel i finanční spoluúčast města.

Finanční náklad na provedení celé stavby je cca 100 milionů Kč. Na město je to poměrně velké „sousto“, protože roční investice města do veškerého majetku města se s ohledem na jeho velikost pohybují okolo této částky.

Ideální stav by byl, kdyby Povodí Labe, státní podnik se pustilo do realizace stavby s tím, že město Rychnov nad Kněžnou přispěje část finančních prostředků právě s ohledem na tuto historickou památku a zachování přírodního kouzla příměstského lesa Včelný.

Věřím, že Vám tyto informace postačí pro zpracování Vašeho projektu.

Děkuji a přeji příjemný den
Jan Skořepa

From: natalasterbova@seznam.cz <natalasterbova@seznam.cz>

Sent: Friday, January 23, 2026 9:01 PM

To: Skořepa Jan <Jan.Skořepa@rychnov-city.cz>

Subject: Projekt "Záchrana Ivanského jezera"

Dobrý den pane starosto,

jmenuji se Natálie Štěrbová a jsem studentkou Obchodní akademie, Střední odborné školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Hradci Králové. Účastním se soutěže Navrhni projekt, kterou organizuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Eurocentry. Jde o to, že máme navrhnout neziskový projekt. Já jsem si se spolužačkou vybrala záchranu Ivanského jezera, jelikož mi přijde škoda, že bychom o něj měli přijít. V našem projektu navrhujeme v první etapě odbahnění jezera a opravu vnější vrstvy hráze, a ve druhé drobné úpravy kolem jezera. Spousta projektů se s podporou EU již zrealizovalo, například projekt studentů ze Žďáru nad Sázavou, kteří pomohli renovovat místní park.

Chtěla bych Vás požádat o vyjádření Vašeho názoru a postoje v kauze, které bych s Vaším dovolením mohla citovat v návrhu projektu, popřípadě je mohu anonymizovat.

Příloha 4:

Email od místostarostky města Rychnova nad Kněžnou Mgr. Jany Drejslové

Seznam Email

13.02.2026 16:15

MJ

Mgr. Jana Drejslová J.Drejslova@seznam.cz
natalasterbova@seznam.cz

29. 1. 2026, 14:52

[Přejít na přílohy](#)

 **Fwd: Ivanské jezero** 

[Shrnutí konverzací](#) [Shrnutí e-mail](#)

Dobrý den,
posílám informace , které jsem obdržela z odboru životního prostředí.....článek ve zpravodaji města (najdete na stránkách města) - Zpravodaj (9/2025).
Rozpočet ještě není.....100 milionů je odhad z roku cca 2021.....tedy předpoklad je tedy vyšší částka.....
Co má být v písemném vyjádření....odpověď na jakou otázku ?.....Asi nejdůležitější je, že Ivanské jezero je ve vlastnictví Povodí Labe, nyní čekáme na jejich vyjádření (do 31.3.....zadali další průzkum) . Potom bude další jednání až na základě výsledku průzkumu. mohu vám ještě poslat jejich poslední vyjádření k celé situaci.....
S pozdravem
Jana Drejslová

----- Původní e-mail -----
Od: Mgr. Jana Drejslová <J.Drejslova@seznam.cz>
Komu: j.drejslova@seznam.cz
Datum: 29. 1. 2026 14:43:13
Předmět: Fwd: Ivanské jezero

----- Původní e-mail -----
Od: Mgr. Jana Drejslová <J.Drejslova@seznam.cz>
Komu: karel.jakoubek@seznam.cz
Datum: 7. 11. 2025 9:33:52
Předmět: Ivanské jezero

----- Původní e-mail -----
Od: Langerová Martina <Martina.Langerova@rychnov-city.cz>
Komu: Drejslová Jana <Jana.Drejslova@rychnov-city.cz>
Datum: 4. 8. 2025 10:42:22
Předmět: FW: Message from "RNP58387934BF78"

Ivanské jezero:
Rok 2016 - TBD, technicko - bezpečnostní dozor ze strany Povodí Labe, s.p. za účasti vodoprávního orgánu, zjištění zvyšujícího se rizika havárie hráze.
Návrh opatření k zajištění bezpečnosti hráze a stability vodního díla, doporučení k celkové opravě

<https://email.seznam.cz/?u=87758736&l&q=prefix%3Amgr&mid=7123>

Stránka 1 ze 2

Příloha 5:

Email od zakladatele spolku Přátelé Ivanského jezera MUDr. Karla Jakoubka

(341) Doručené – Seznam Email

17.02.2026 13:38



<https://email.seznam.cz/?q=label-id%3A258%20sort-by%3Adate&mid=7429&u=87758736>

Stránka 1 z 1

Příloha 6:

Emailová konverzace mezi MUDr. Karlem Jakoubkem a historičkou Mgr. Hanou Voškerušovou-Balcarovou

[341] Doručené – Seznam Email

17.02.2026 17:30

 **MUDr. Karel Jakoubek** Karel.Jakoubek@seznam.cz 17. 2. 2026, 15:23

 natalasterbova@seznam.cz

 **Fwd:** 

 Shrnout konverzaci  Shrnout e-mail

----- Původní e-mail -----

Od: hana.voskerusova@email.cz
Komu: karel.jakoubek@seznam.cz
Datum: 17. 2. 2026 13:32:51
Předmět:

Dobrý den,
posílám předělaný a zkrácený text k obhajobě zachování Ivanského jezera.
Omlouvám se, ale cesta k přiblížení se pravdě je někdy delší a klopotná. Zdraví a úspěch přeje

Hana Voškerušová-Balcarová

Vážení účastníci,

předkládáme stručný odborný podklad k Ivanskému jezeru, který shrnuje jeho historickou a technickou hodnotu. Jeho cílem je poskytnout fakta založená mimo jiné na archivních pramenech, která umožní informovanou a vyváženou diskusi o budoucnosti hráze a nádrže.

Text nehodnotí navrhované ekologické cíle negativně; naopak ukazuje, že je možné hledat kompromisní řešení, které umožní koexistenci historického díla a přírodních funkcí.

Ivanské jezero bylo vybudováno v letech 1905–1907 jako akumulční vodárenská nádrž určená k zajištění dostatečných zásob vody pro město Rychnov nad Kněžnou v obdobích sucha. Primárním cílem projektu tedy nebyla ochrana před povodněmi, nýbrž stabilizace vodního zdroje a zajištění spolehlivého zásobování obyvatelstva i prosperujících podniků města vodou.

Retenční charakter nádrže však přirozeně přinášel i vedlejší efekt částečné transformace průtoků a zpomalení odtoku při zvýšených srážkách.

V historickém kontextu počátku 20. století tak Ivanské jezero představuje významný doklad modernizace městské infrastruktury a navíc jde o ojedinělou dochovanou vodárenskou akumulční nádrž tohoto typu v regionu. Jeho hodnota proto spočívá nejen

<https://email.seznam.cz/?u=87758736&l&q=label-id%3A258%20sort-by%3Adate&mid=7433>

Stránka 1 ze 2

ve stavebně-technickém řešení, ale i v autenticky dochované funkci, kterou plní již více než sto let.

Interpretace funkce těchto vodních děl se v průběhu času mění podle aktuálních potřeb společnosti a dobového pohledu na krajinu, a vodní dílo, nacházející se od roku 1996 v přírodním parku Les Včelný, tak dnes nabývá nové významné funkce, zejména funkce stavebně-historické. Vodní dílo je v současnosti jedinečným dokladem regionálního inženýrství.

Chápeme a respektujeme ekologické cíle, které jsou v současnosti důležité, ale myslíme, že je možné najít kompromisní řešení, které umožní:

- zachovat hráz a hladinu nádrže,
- současně vytvořit mokřadní plochy v okolí,
- tím sladit historickou hodnotu s cíli ochrany přírody.

Náš návrh proto spočívá v tom, aby rozhodnutí o budoucnosti Ivanského jezera vycházelo z variantního řešení, které umožní koexistenci historického díla a ekologických funkcí, namísto zániku hráze.

Děkuji za pozornost

Příloha 7:

Dotazníkové šetření

Záchrana Ivanského jezera

Dobrý den, jsme studentky z Obchodní akademie Hradec Králové a navrhujeme projekt do soutěže "Navrhni projekt". Snažíme se o záchranu Ivanského jezera, které je součástí přírodního parku Les Včelný a nachází se nedaleko Rychnova nad Kněžnou. Chceme navrhnout projekt, na který by poskytla Evropská unie své dotace. Uvítáme každou odpověď, nápad i poznámku. Děkujeme za Váš čas.

1. Souhlasíte s tím, že by nedošlo k zániku Ivanského jezera?

☐ Ano


☐ Ne

2. Sem nám prosím napište jakékoli názory, nápady i kritiku. Např. pokud nesouhlasíte, tak důvod proč, pokud souhlasíte, napište nějaké tipy na věci, co vám chybí v okolí Ivanského jezera nebo v parku, různé zlepšováky, atd.

Zadejte svoji odpověď.

Příloha 8:

Výpis z katastru s přehlednou tabulkou

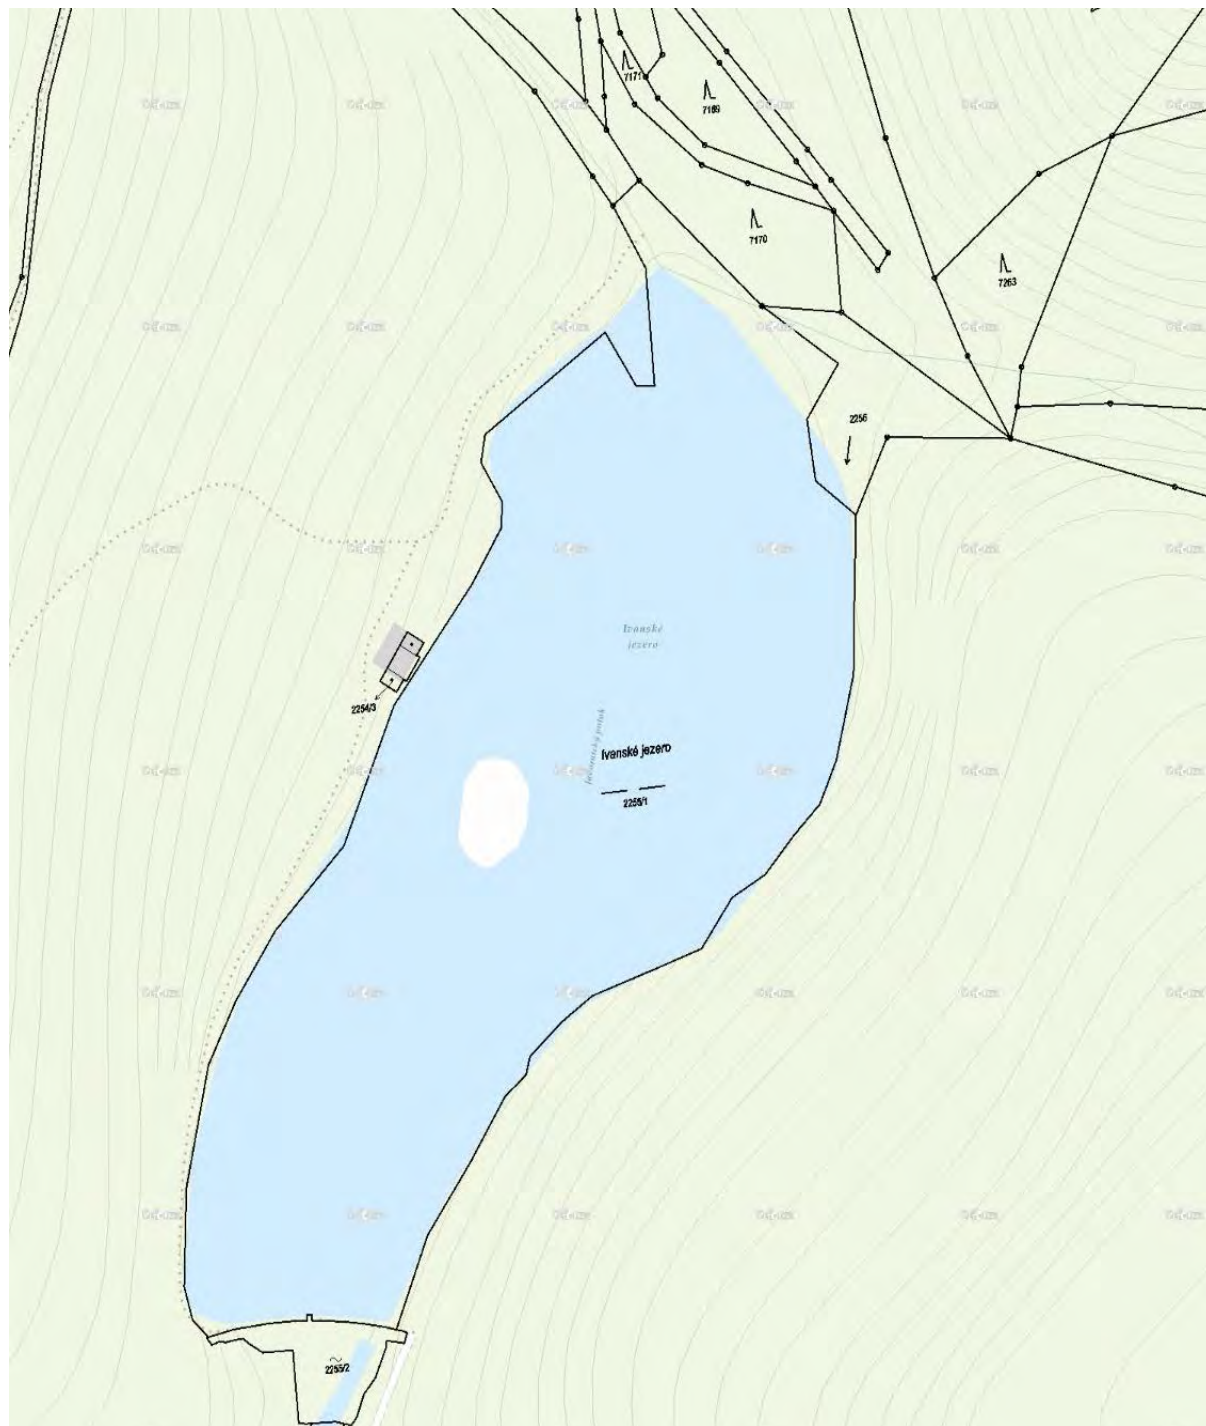

Parcelní číslo	Vlastnické právo	Právo hospodařit s majetkem státu
2254/1	Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčková 136, 51601 Rychnov nad Kněžnou	-
2254/3	Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčková 136, 51601 Rychnov nad Kněžnou	-
2255/1	Česká republika	Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové
2255/2	Česká republika	Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové
2256	Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčková 136, 51601 Rychnov nad Kněžnou	-
2257/1	Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčková 136, 51601 Rychnov nad Kněžnou	-
5225	Česká republika	Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové
7170	Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčková 136, 51601 Rychnov nad Kněžnou	-

Příloha 9:

Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo stavby objednatele: 129190002, 229180004

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:

Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Martin Oliva, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:

70890005

DIČ:

CZ70890005

Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název:

/doplň účastník/

Adresa sídla:

/doplň účastník/

Statutární orgán:

/doplň účastník/

Osoba oprávněná k podpisu: /doplň účastník/

Zástupce pro věci technické: /doplň účastník/

Hlavní projektant:

/doplň účastník/

IČ:

/doplň účastník/

DIČ:

/doplň účastník/

Obchodní rejstřík:

/doplň účastník/

(dále jen zhotovitel)

1. Předmět díla

1.1. Název zakázky: **VD Ivanské jezero, obnova vodního díla**

Tato zakázka se skládá ze dvou níže uvedených jednotlivých akcí:

**č. akce 129190002 VD Ivanské jezero, Rychnov n. Kn., odtěžení nánosů,
ř. km 3,400 - 3,700**

č. akce 229180004 VD Ivanské jezero, rekonstrukce hráze, ř. km 3,400

1.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na každou jednotlivou akci, k výkonu inženýrských činností potřebných pro povolení realizace obou akcí a provádění autorského dozoru projektanta při realizaci akcí, dle níže uvedeného členění dílčích etap:

I. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen **DUR**) k akci „VD Ivanské jezero, rekonstrukce hráze, ř. km 3,400“ dle přílohy č. 1 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. (čl. 1. odstavec A obchodních podmínek).

II. etapa: Výkon inženýrské činnosti (dále jen **IČ**) spočívající zejména v zajištění vydání pravoplatného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu k akci „VD Ivanské jezero, rekonstrukce hráze, ř. km 3,400“ a případné povolení kácení.

III. etapa: Vypracování konceptu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen **DSP**) k akci „VD Ivanské jezero, rekonstrukce hráze, ř. km 3,400“ dle přílohy č. 12 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

IV. etapa: Vypracování jednostupňové projektové dokumentace (dále jen **DSJ**) k akci „VD Ivanské jezero, Rychnov n. Kn., odtěžení nánosů, ř. km 3,400 – 3,700“. DSJ bude zpracována v členění dle přílohy č. 12 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 13 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Dále výkon IČ spočívající zejména v zajištění potřebných pravomocných povolení pro realizaci obou akcí a vypracování konečné verze **DSP** k akci „VD Ivanské jezero, rekonstrukce hráze, ř. km 3,400“.

V. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 13 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen **DPS**) k akci „VD Ivanské jezero, rekonstrukce hráze, ř. km 3,400“.

V průběhu zpracování DPS zhotovitel zajistí, aby nebyly měněny technické detaily díla mající vliv na již vydaná povolení stavby zajištěná v předchozí etapě. V případě, že ojediněle dojde k vynuceným technickým změnám oproti DSP, pak je zhotovitel povinen zajistit před předáním dokončené DPS také rozhodnutí o změně stavebního povolení, případně vyjádření kompetentního úřadu, že projektové změny nevyžadují změnu stavebního povolení.

VI. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen **AD**) během realizace stavby (čl. 1. odstavec E obchodních podmínek) pro každou jednotlivou akci.

1.3. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy i následující činnosti:

- a) inženýrsko-geologický průzkum v rozsahu dle podkladu „VD Ivanské jezero - specifikace IGP“,
- b) vyprojektování sedimentační záchytné nádrže,

- a) posouzení a vyprojektování případných úprav přístupové komunikace pro techniku nutnou k realizaci,
- b) zajištění stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody k závažnosti zásahu a rozsahu dotčených zájmů dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. Nebude-li ve zmíněném stanovisku uvedeno jinak, zajistí zhotovitel zpracování hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na tyto chráněné zájmy a zpracuje návrhy opatření k vyloučení nebo alespoň zmírnění negativního vlivu na chráněné části přírody a zpracuje návrhy náhradních opatření do DUR,
- c) zajištění majetkoprávních podkladů vyžadovaných zákonem nezbytných pro vydání příslušného územního rozhodnutí či územního souhlasu.

1.1. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci II. etapy i následující činnosti:

- a) v rámci výkonu IČ zhotovitel obstará pravomocná povolení nutná pro zajištění právoplatného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu včetně úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním těchto povolení pro stavbu hráze, sedimentační nádrže či úpravu přístupových cest,
- b) výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění vydání povolení kácení (bude-li ho realizace některé z akcí vyžadovat).

1.2. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci III. etapy i následující činnosti:

- a) zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, apod., to znamená, že si zhotovitel zajistí kompletní projednání DSP se všemi dotčenými osobami, správními orgány, především s orgány ochrany přírody, a zpracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace,
- b) zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního, to znamená, že zhotovitel v případě potřeby zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se všemi vlastníky stavbou dotčených pozemků a nemovitostí (vzory a forma smluvních vztahů bude projednána a odsouhlasena majetkovým odborem objednatele) a zpracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace.
- c) součástí projektové dokumentace budou také stavební objekty řešící bourací práce původní hráze, výstavbu sedimentační záhytné nádrže a nezbytné úpravy přístupové komunikace pro přístup techniky nutné pro realizaci.

1.3. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci IV. etapy i následující činnosti:

- a) geodetické zaměření
 - mocnosti sedimentů v rozsahu maximální zátopy dle manipulačního řádu nádrže. V případě, že je k dispozici dokumentace skutečného provedení stavby, případně jiná relevantní dokumentace, kde je definována původní (návrhová) úroveň dna v rozsahu celé zátopy, bude provedeno zaměření pouze stávajícího dna (úrovně sedimentu). Mocnost sedimentu pak bude stanovena na základě rozdílu stávajícího a původního dna dle dokumentace,

Geodetické zaměření bude provedeno osobou odborně způsobilou dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů.
- b) zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, apod., to znamená, že si zhotovitel zajistí kompletní projednání DSJ se všemi dotčenými osobami, správními orgány, především s orgány ochrany přírody, a zpracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace,

- a) vyprojektování ekonomicky nejvýhodnějšího způsobu využití nebo odstranění nánosů po jejich vytěžení z prostoru nádrže v souladu s platnými právními předpisy a doložení navrženého způsobu nakládání s vytěženými nánosy právními předpisy vyžadovanými podklady a doklady, že lze navržený způsob nakládání s vytěženým materiálem realizovat (např. protokoly o provedených odběrech a rozborech vzorků těžených nánosů),
- b) zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního, to znamená, že zhotovitel v případě potřeby zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se všemi vlastníky stavbou dotčených pozemků a nemovitostí (vzory a forma smluvních vztahů bude projednána a odsouhlasena majetkovým odborem objednatele) a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace. V případě, že výsledky rozborů sedimentu umožní jeho uložení na povrchu terénu nebo ZPF, bude součástí majetkoprávního vypořádání i smluvní zajištění lokalit pro uložení sedimentu,
- c) součástí projektové dokumentace bude řešení zajištění přístupu k sedimentu a jeho odvodnění do podoby potřebné k následnému odvozu a uložení.

1.1. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci V. etapy i následující činnosti:

Rozkreslení podrobných výkresů výztuže nutných pro provedení díla nad rámec daný přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Rozkreslení konstrukčních detailů provedení dilatačních a pracovních spár.

1.2. Veškeré projektové dokumentace, které jsou předmětem této smlouvy, budou zpracovány osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

1.3. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

- Záměr opravy na akci „VD Ivanské jezero, Rychnov n. Kn., odtěžení nánosů, ř.km 3,400 - 3,700“ zpracovaný závodem Pardubice v 03/2017,
- Investiční záměr na akci „VD Ivanské jezero, rekonstrukce hráze, ř. km 3,400“ zpracovaný závodem Pardubice v 03/2017,
- aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“,
- rozborů sedimentů provedené objednatelem v 12/2005,
- Manipulační řád MVN Ivanské jezero,
- návrh opatření k zajištění bezpečnosti a stability vodního díla zpracovaný firmou VODNÍ DÍLA – TBD a.s. v listopadu 2016.

1.4. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. 3. 2018.

2. Doba plnění díla

2.1. Předpoklad zahájení prací: **prosinec 2019 – leden 2020**

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

2.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla pro jednotlivé akce objednateli:

do 31. 12. 2028

1.1. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

I. etapa - projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby k akci „VD Ivanské jezero, rekonstrukce hráze, ř. km 3,400“: **do 20. 12. 2020**

II. etapa - výkon inženýrské činnosti spočívající ve vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu k akci „VD Ivanské jezero, rekonstrukce hráze, ř. km 3,400“: **do 180 dnů od písemné výzvy objednatele**

III. etapa – koncept projektové dokumentace DSP pro akci „VD Ivanské jezero, rekonstrukce hráze, ř. km 3,400“ nejpozději: **do 150 dnů od písemné výzvy objednatele**

IV. etapa – dokončení projektových dokumentací - DSJ pro akci „VD Ivanské jezero, Rychnov n. Kn., odtěžení nánosů, ř. km 3,400 - 3,700“, konečná verze DSP pro akci „VD Ivanské jezero, rekonstrukce hráze, ř. km 3,400“ a výkon inženýrské činnosti spočívající ve vydání právoplatného povolení realizace obou akcí, nejpozději: **do 180 dnů od písemné výzvy objednatele**

V. etapa - projektová dokumentace DPS pro akci „VD Ivanské jezero, rekonstrukce hráze, ř. km 3,400“, nejpozději: **do 150 dnů od písemné výzvy objednatele**

VI. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: **do 31. 12. 2028**

1.2. Objednatel je oprávněn změnit termíny plnění této smlouvy v případě, že dojde k prodloužení prokazatelně nezaviněnému zhotovitelem např. nedodržování správních lhůt DOSS při vyjadřovací činnosti a povolování stavby apod.

2. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne /doplň účastník/. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí /doplň účastník/ Kč,

slovy: /doplň účastník/ korun českých bez DPH.

3. Zvláštní ustanovení

3.1. Zhotovitel zajistí doručení uzavřených smluv se všemi subjekty, s kterými byly smlouvy jeho prostřednictvím uzavřeny a to v počtu vyhotovení uvedených v konkrétních smlouvách. Doklad o doručení předloží objednateli po ukončení inženýrské činnosti.

3.2. Je-li předmětem díla provedení či doplnění IG průzkumu, zajistí zhotovitel prokazatelné odevzdání jednoho vyhotovení IG průzkumu a to ve stanoveném rozsahu a úpravě k trvalému uchovávání České geologické službě. Doklad o předání IG průzkumu bude součástí předání díla.

3.3. Koncept projektové dokumentace bude odevzdán objednateli v jednom paré v papírové podobě a v elektronické podobě. Součástí konceptu bude u PD DSP položkový rozpočet.

3.4. Doklady získané zhotovitelem přes datovou schránku musí být v el. podobě uloženy a předány objednateli kompletní, tedy včetně obálky s elektronickým podpisem a časovým razítkem.

- 1.1. V případě že budou v projektové dokumentaci specifikovány parametry přírodních materiálů (zeminy, lomový kamen, apod.) ověří si zhotovitel jejich dostupnost v ekonomicky přijatelné vzdálenosti a to v požadovaném množství a kvalitě.
- 1.2. V žádostech podaných orgánům státní správy bude vždy žádáno o vydání stanoviska či rozhodnutí s co nejdelší zákonem přípustnou platností.
- 1.3. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – bod 2. a 12.
 - čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (DSP) - bod 18.
 - čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) – bod 11.
 - čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby – body 1. – 21.
 - čl. 8. Odstoupení od smlouvy, bod 3. a 4.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 2.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Hradci Králové dne

V dne

.....
za objednatele
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

.....
[doplňtí účastník]

Poděkování

Tímto bychom chtěly moc poděkovat všem, od kterých se nám dostalo pomoci s naším projektem. V první řadě děkujeme naší škole Obchodní akademii, Střední odborné škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v čele s paní ředitelkou Mgr. Janou Vitvarovou, která nám umožnila účast v soutěži Navrhni projekt 2025/2026. Dále velký dík patří paní učitelce Ing. Jitce Rulfové Janů, která nás celým procesem utváření našich projektů provázela a byla vždy ochotna nám s čímkoli pomoci. Děkujeme i městu Rychnov nad Kněžnou a zástupcům Povodí Labe, kteří nám poskytli mnoho užitečných a zajímavých informací, rad a dokumentů, které nám pomohly s prací na projektu.
